


Bauzeitenplan - K 47, Deckenerneuerung 2017, Los 1

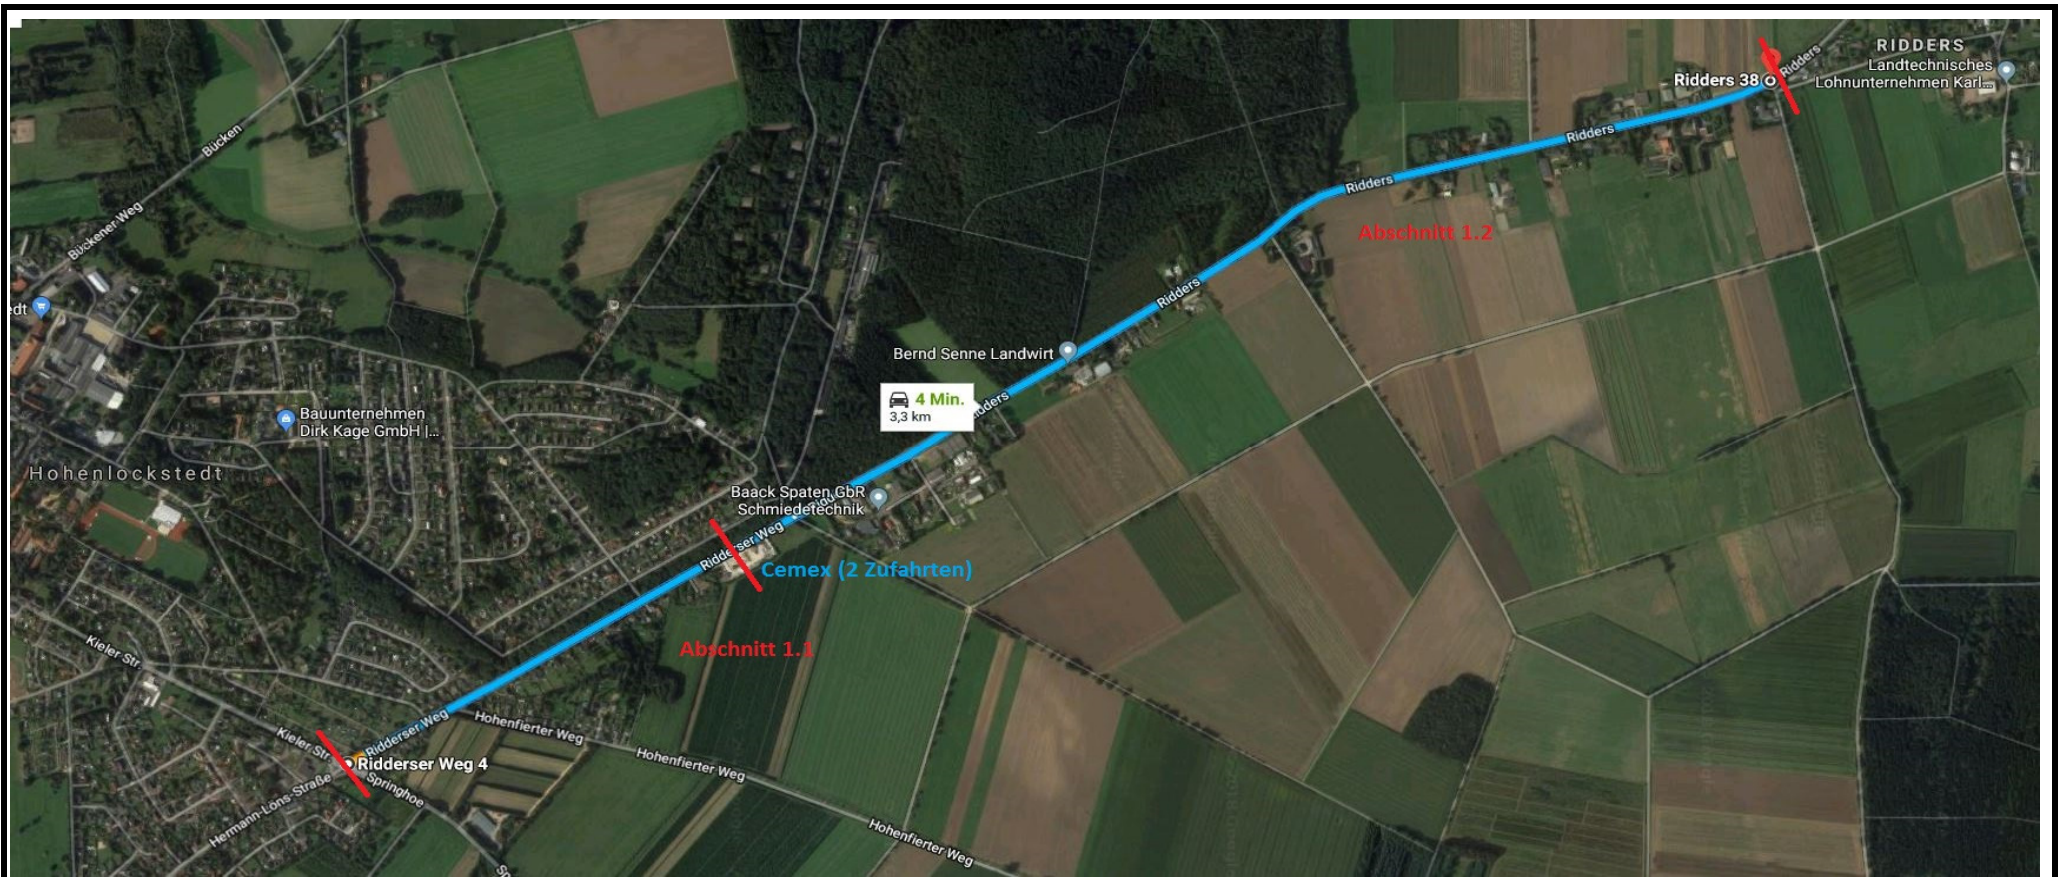

<p>Bauphase 1:</p> <p>02.05., 07:00 Uhr bis 09.05., 16:00 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vollsperrung Los 1 (Abschnitt 1.1 und 1.2) - Anlieger frei im Abschnitt 1.2 - lückenlose Vollsperrung im Abschnitt 1.1 mit LSA in der Kieler Straße - Anlieger frei während Restarbeiten ab 07.05.2018
--	---

<p>Bauphase 2:</p> <p>14.05., 07:00 Uhr bis 18.05., 16:00 Uhr</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vollsperrung Los 1 (Abschnitt 1.1 und 1.2) - Anlieger frei im Abschnitt 1.1, ohne LSA in der Kieler Straße - lückenlose Vollsperrung im Abschnitt 1.2
--	---

	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Bauphase 1 - ca. 950 m, 5.700 m2, 34 Schächte

1	Einrichtung VS, Bauphase 1																	
2	Ausbauen der Schachtabdeckungen																	
3	Bankett abschieben Abschnitt 1.1 und 1.2																	
4	5.700 m2, 4 cm fräsen																	
5	5.700 m2 Hochdruckreinigung																	
6	5.700 m2 Bitumenemulsion C 60																	
7	5.000 m2 AC 11 DS (ohne Kreuzungsbereich)																	
8	700 m2 AC 11 DS im Kreuzungsbereich																	
9	Schachtabdeckungen regulieren																	
10	Fugen schneiden und verfüllen																	

Bauphase 2 - ca. 2.300 m, 14.000 m2

1	Einrichtung VS, Bauphase 2																	
2	14.000 m2, 4 cm fräsen																	
3	14.000 m2 Hochdruckreinigung																	
4	14.000 m2 Bitumenemulsion C 60																	
5	14.000 m2 AC 11 DS																	
6	Angleichung von Zufahrten / Einmündungen																	
7	Bankett regulieren																	

Markierung ab der 21. KW
